Befaring Gårasjyen 80, 9475 Borkenes 10.04.26

I forbindelse med tiltenkt utbedring og framtidig produksjon ved Gårasjyen 80, 9475 Borkenes, har Arctic Lobster Farm AS vært på befaring ved lokaliteten 10.04.2026. Hensikten ved befaring var undersøkelse av innkjøring til lokaliteten via Fv83 og dokumentere tilstand som kan ligge til grunnlag for eventuell påkjenning Arctic Lobster Farms utbedring av lokaliteten kan påføre veien.

Befaring ble utført av Anders Eide-Jenssen (Prosjektleder, Arctic Lobster Farm AS) og Jan Erik Jenssen (Daglig Leder, AC Designtech AS).

Ved tildelt konsesjon vil Arctic Lobster Farm AS starte diverse utbedring av lokaliteten. Dette vil i hovedsak innebære:

- Fjerne eksisterende bygg.
- Bygge nytt bygg på nåværende fundament.
- Grave rørkanaler.
- Oppgradering av elektrisk infrastruktur.
- Grave pumpekum.
- Nedlegging av inntak-/ og utslippsledning.
- Kle igjen gruslager.

Under utbedringen vil det også være levering av diverse utstyr tilhørende produksjon og utbedring.

Aktiviteten vil periodevis føre til økt tilkomst av tyngre trafikk enn normalt, samt privat trafikk. Under aktiv produksjon vil det kun være sporadisk lastebil trafikk ved levering.

Vedlagt denne redegjørelsen er bilder tatt under befaring som viser tilstand av veien fra lokaliteten og opp mot Fv83. Verken representant fra Arctic Lobster Farm AS eller AC Designtech AS har kompetanse innen by/bygd vei infrastruktur, vedlikehold av asfaltveier eller teknisk bakgrunn innen feltet. Observasjoner og redegjørelse er gjort på et grunnleggende nivå.

Veien er i all hovedsak hel og uten store skader. Det er derimot sprekkdannelse i asfalten sporadisk gjennom hele strekningen. Det er et større parti fra starten av bakken opp mot krysset hvor asfalten mangler. Dette partier er på ca 1x3m, dybde på ca 4-6cm på det grunneste og 8-12cm på det dypeste. Dette vil nok med nedbør og smelting vokse. Videre opp veien er det tre tilfeller hvor partier mangler asfalt. Et av disse bærer preg av en tidligere ferist. Også disse vil antageligvis vokse med nedbør.

Både på nord og sørside av veien er det overkjørsel for traktor ned på jorder. Her er asfalten i ytterkant sprukket, og stykker er løsnet. En grøft går langs hele veien på nordsiden fra krysset og ned til lokaliteten hvor det havner i en stikkrenne under veien og ut i havet. Det er to tilkomster av ferskvann på nordsiden som renner ned i denne grøften, om dette kommer fra smeltevann eller en annen kilde er uvisst. Krysset er svært oversiktlig i både vest-/ og østlig retning. Innkjøring mot lokaliteten har en sval sving og bakken ned mot lokaliteten tilsvarende sval. Det er en kumme øverst ved krysset og en i grøft på sør-vest siden av grøft ved kryss.

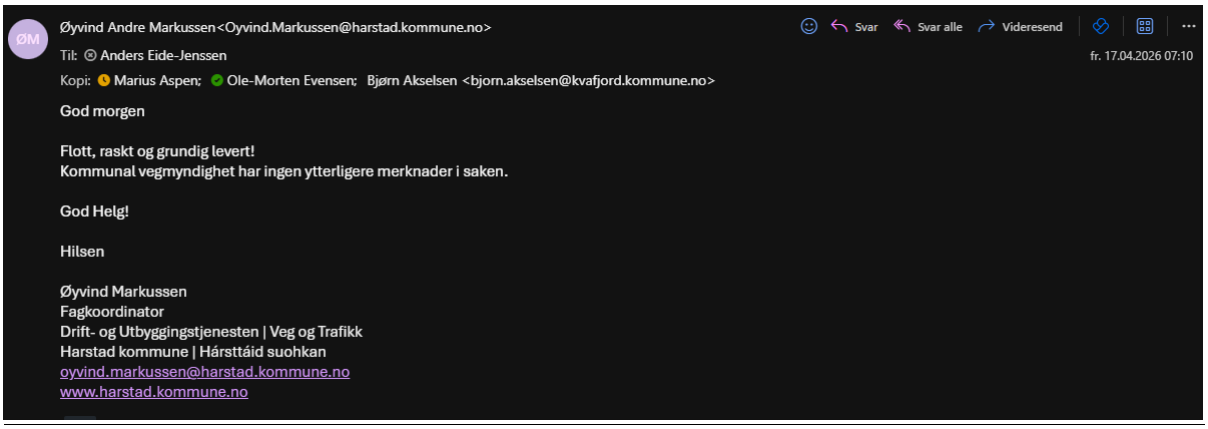

Øyvind Andre Markussen<Oyvind.Markussen@harstad.kommune.no>

Svar Svar alle Videresend

Til: Anders Eide-Jenssen

fr. 17.04.2026 07:10

Kopi: Marius Aspen; Ole-Morten Evensen; Bjørn Akselsen <bjorn.akselsen@kvafjord.kommune.no>

God morgen

Flott, raskt og grundig levert!
Kommunal vegmyndighet har ingen ytterligere merknader i saken.

God Helg!

Hilsen

Øyvind Markussen
Fagkoordinator
Drift- og Utbyggingstjenesten | Veg og Trafikk
Harstad kommune | Hárstáid suohkan
oyvind.markussen@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no
